VISIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS

ESTADÍSTICAS DE RECURSOS

Estado de trabajo de todos los recursos de trabajo.

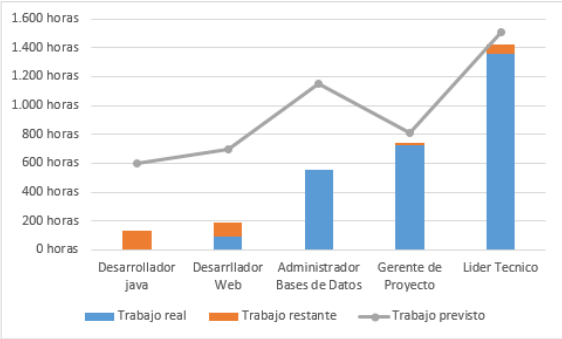

ESTADO DEL TRABAJO

% trabajo realizado por todos los recursos de trabajo.

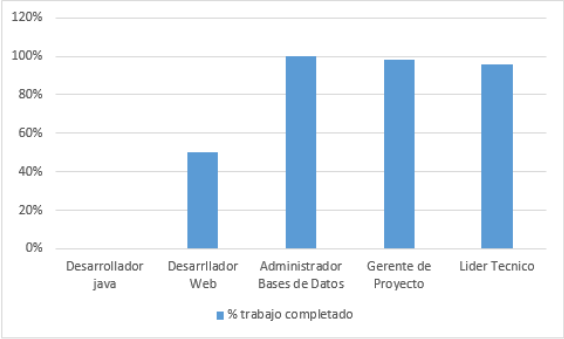

ESTADO DE LOS RECURSOS

Resta trabajo para todos los recursos de trabajo

Nombre	Comienzo	Fin	Trabajo restante
Desarrollador java	vie 9/03/18	vie 29/06/18	136 horas
Desarrllador Web	vie 9/03/18	vie 29/06/18	96 horas
Administrador Bases de Datos	vie 23/03/18	mié 9/05/18	0 horas
Gerente de Proyecto	mié 27/09/17	lun 18/06/18	16 horas
Lider Tecnico	lun 2/10/17	jue 28/06/18	64 horas

RECURSOS SOBREASIGNADOS

ESTADO DEL TRABAJO

Estado del trabajo para recursos sobreasignados.

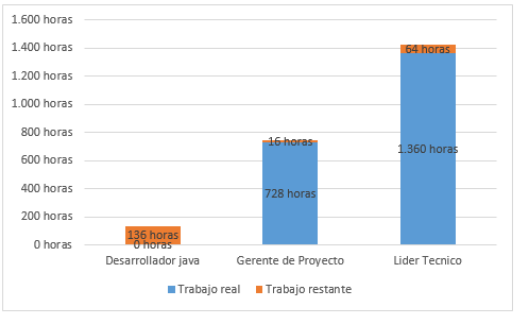

SOBREASIGNACIÓN

Trabajo de excedente asignado a los recursos sobreasignados. Para resolver las sobreasignaciones use Vista de planeador de equipo

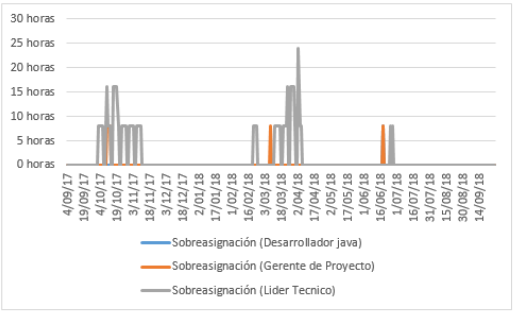

FLUJO DE CAJA

Costo real	Costo de línea base	Costo restante	Variación de costo
$ 65.320.000,00	$ 46.170.000,00	$ 5.245.000,00	$ 24.395.000,00



El gráfico muestra el costo acumulado del proyecto y el costo por trimestre.
Para ver los costos de un período de tiempo diferente, selecciona la opción Editar en la lista de campos.

La siguiente tabla muestra información sobre los costos para todas las tareas de nivel superior.
Para ver estadísticas del costo de todas las tareas, establece el nivel de esquema en la lista de campos.

Nombre	Costo restante	Costo real	Costo	CRTR	CPTR	CPTP
Trimestre I	$ 0,00	$ 23.660.000,00	$ 23.660.000,00	$ 23.660.000,00	$ 0,00	$ 0,00
Trimestre II	$ 0,00	$ 28.370.000,00	$ 28.370.000,00	$ 28.370.000,00	$ 2.950.000,00	$ 2.950.000,00
Trimestre III	$ 2.500.000,00	$ 13.290.000,00	$ 15.790.000,00	$ 13.290.000,00	$ 10.970.000,00	$ 10.970.000,00
Trimestre IV	$ 2.745.000,00	$ 0,00	$ 2.745.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.800.000,00
Trimestre V	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Trimestre VI	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

INFORMACIÓN GENERAL DE COSTOS DE LA

ESTADO DE COSTO

Estado de costo para las tareas de nivel superior.

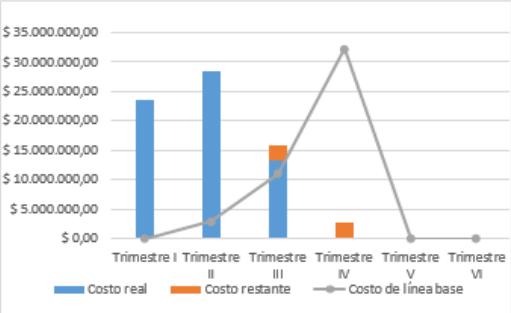

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Cómo los costos están distribuidos entre las tareas en función de su estado.

DETALLES DE COSTOS

Detalles de costos para todas las tareas de nivel superior.

Nombre	Costo fijo	Costo real	Costo restante	Costo	Costo de línea base	Variación de costo
Trimestre I	$ 0,00	$ 23.660.000,00	$ 0,00	$ 23.660.000,00	$ 0,00	$ 23.660.000,00
Trimestre II	$ 0,00	$ 28.370.000,00	$ 0,00	$ 28.370.000,00	$ 2.950.000,00	$ 25.420.000,00
Trimestre III	$ 0,00	$ 13.290.000,00	$ 2.500.000,00	$ 15.790.000,00	$ 10.970.000,00	$ 4.820.000,00
Trimestre IV	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.745.000,00	$ 2.745.000,00	$ 32.250.000,00	-$ 29.505.000,00
Trimestre V	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Trimestre VI	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

VALOR ACUMULADO

La administración del valor acumulado le ayuda a cuantificar el rendimiento de un proyecto. Compara los costos y las programaciones para una línea de base para determinar si el proyecto progresa.

Si el aspecto de los gráficos no es correcto, asegúrese de que ha establecido una línea de base, ha asignado los costos a tareas o recursos, y ha introducido el progreso.

CEF	CRTR	CPTR
$ 216.657.400,28	$ 65.320.000,00	$ 13.920.000,00



Más información sobre el valor acumulado

VALOR ACUMULADO EN EL TIEMPO

El valor acumulado del proyecto basado en la fecha de estado. Si el costo real (CRTR) es superior al valor acumulado (CPTR), el proyecto está por encima del presupuesto. Si el valor planeado (CPTP) es mayor que el valor acumulado, el proyecto está atrasado respecto a la programación.

VARIACIÓN EN EL TIEMPO

Variaciones de costo y calendario para el proyecto basadas en la fecha de Estado. Si el CV es negativo, el proyecto es más de lo presupuestado. Si el VP es positivo el proyecto está retrasado con respecto a la programación.

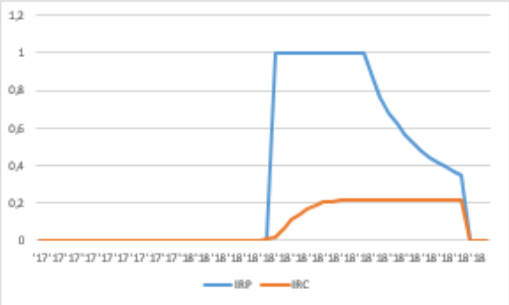

ÍNDICES EN EL TIEMPO

Índices de rendimiento de costo y programación para el proyecto basados en la fecha de estado. Cuanto mayor sea el índice de rendimiento, más avanzado en la programación y el ahorro de costos estará el proyecto.

SOBRECOSTOS

VARIACIÓN DE COSTO DE TAREA

Variación de costos para todas las tareas de nivel superior en el proyecto.

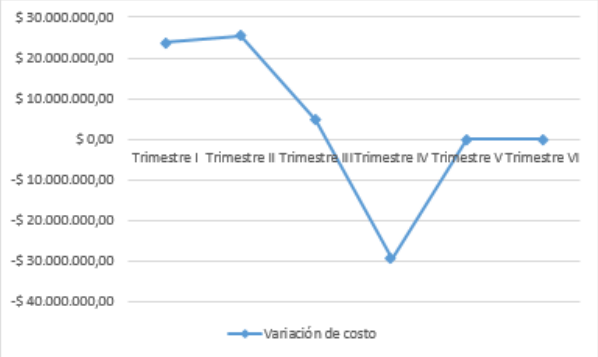

Nombre	% completado	Costo	Costo de línea base	Variación de costo
Trimestre I	100%	$ 23.660.000,00	$ 0,00	$ 23.660.000,00
Trimestre II	100%	$ 28.370.000,00	$ 2.950.000,00	$ 25.420.000,00
Trimestre III	83%	$ 15.790.000,00	$ 10.970.000,00	$ 4.820.000,00
Trimestre IV	0%	$ 2.745.000,00	$ 32.250.000,00	-$ 29.505.000,00
Trimestre V	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Trimestre VI	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

VARIACIÓN DE COSTO DE RECURSOS

Variación de costo de todos los recursos de trabajo.

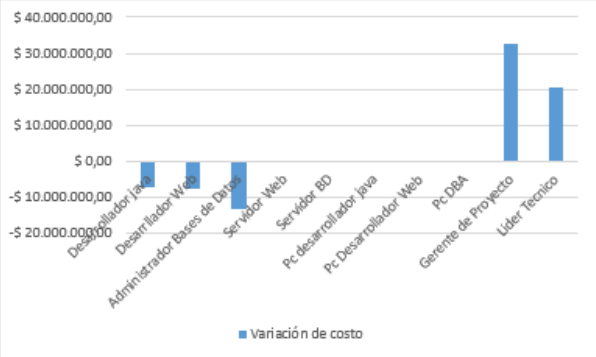

Nombre	Costo	Costo de línea base	Variación de costo
Desarrollador java	$ 2.125.000,00	$ 9.375.000,00	-$ 7.250.000,00
Desarrllador Web	$ 3.000.000,00	$ 10.875.000,00	-$ 7.875.000,00
Administrador Bases de Datos	$ 12.420.000,00	$ 25.920.000,00	-$ 13.500.000,00
Gerente de Proyecto	$ 32.550.000,00	$ 0,00	$ 32.550.000,00
Lider Tecnico	$ 20.470.000,00	$ 0,00	$ 20.470.000,00

VISIÓN GENERAL DE COSTO DE RECURSOS

ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de los recursos de trabajo.

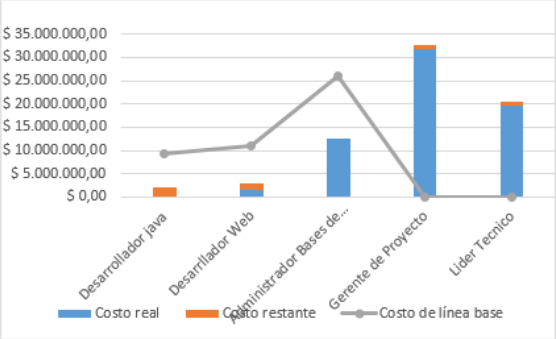

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Cómo los costos están distribuidos entre tipos de recursos diferentes.

DETALLES DE COSTOS

Detalles de costos de todos los recursos de trabajo.

Nombre	Trabajo real	Costo real	Tasa estándar
Desarrollador java	0 horas	$ 0,00	$ 15.625,00/hora
Desarrllador Web	96 horas	$ 1.500.000,00	$ 15.625,00/hora
Administrador Bases de Datos	552 horas	$ 12.420.000,00	$ 22.500,00/hora
Gerente de Proyecto	728 horas	$ 31.850.000,00	$ 43.750,00/hora
Lider Tecnico	1.360 horas	$ 19.550.000,00	$ 14.375,00/hora
